

Анализ изменения цены контрактов «под ключ»¹

В рамках анализа были проанализированы изменения цен 152 контрактов «под ключ» из выборки КСО (рисунок № 1).

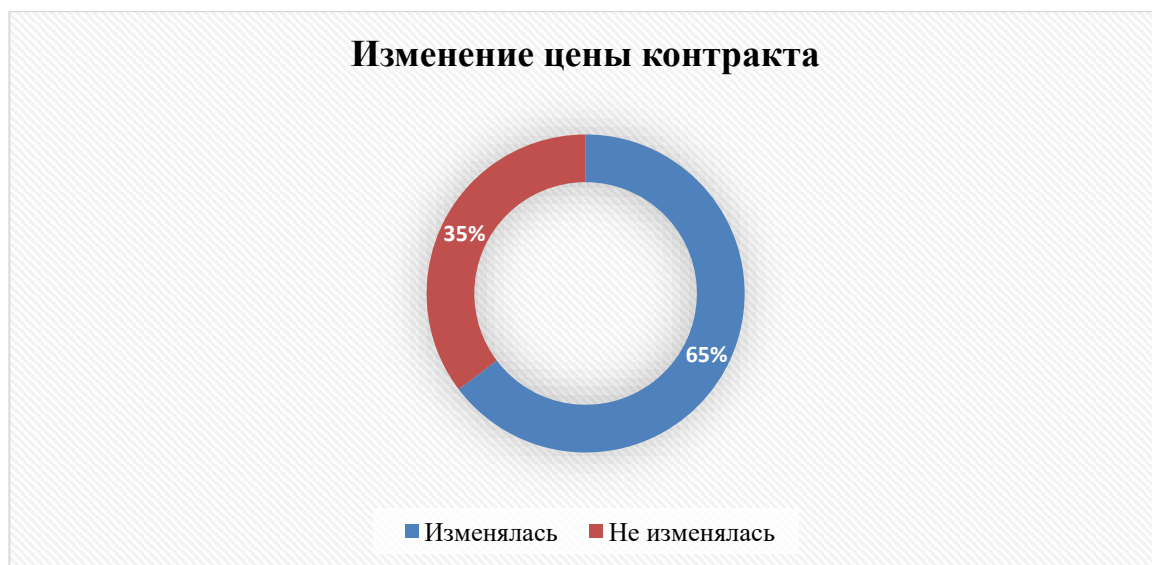


Рисунок 1. Количество контрактов «под ключ», в которых изменялась цена.

Как видно на рисунке 1, в ходе исполнения контрактов «под ключ» цена контракта изменялась в большинстве случаев (65%).

Из 99 контрактов, в которые вносились изменения цены², в 90 контрактов цена была увеличена, при этом цена 9 контрактов была снижена, в том числе по результатам проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости и/или изменения объемов и видов работ по контракту.

В результате анализа выявлялись контракты, цены которых увеличены более чем на 30% от первоначальной цены контракта (в диапазоне от 31.1 % до 250,2%).

В большинстве случаев причиной значительного увеличения цен контрактов «под ключ» (более 30%) КСО отмечают увеличение сметной

¹ Увеличение цены контракта более, чем на 30% от первоначальной (часть 62 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ).

² Из 53 контрактов, в цену которых не вносились изменения, 39 - исполняются, 5 - исполнены, 9 – расторгнуты.

стоимости в соответствии с положительными заключениями государственных экспертиз и необходимость корректировки разработанной в ходе исполнения контракта рабочей и проектной документации.

Как видно из рисунка № 2, из 152 контрактов «под ключ» увеличение цены контракта более чем на 30% от первоначальной цены контракта имело место в 34 случаях (22,37 %). Таким образом, увеличение цены контракта выше установленного законодательством предела имеет место почти в каждом пятом из исследованных контрактов «под ключ».

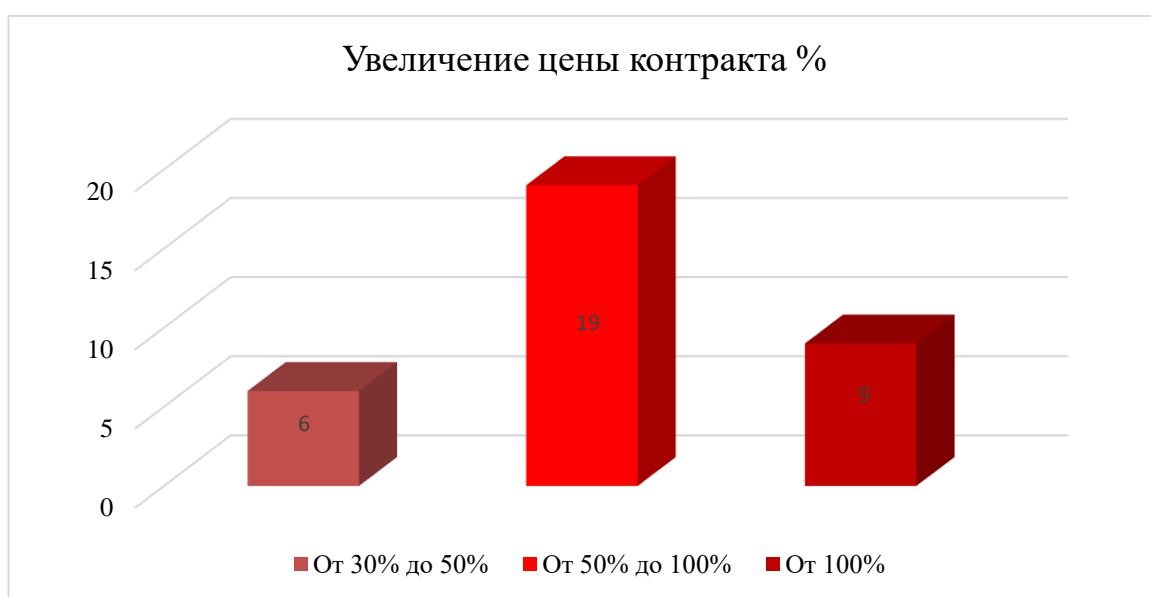


Рисунок 2. Количество контрактов «под ключ», цена которых увеличена более чем на 30%.
